

Заказчик: ООО «Заказчик» (условно)

Подрядчик: ООО «Подрядчик» (условно)

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Реконструкция тепловой сети 2Ду200 от УТ-3 до УТ-5 по ул. Условной, г. Н-ск (объект условный, все данные изменены)

Участок тепловой сети УТ-3 — УТ-5
2Ду200, подземная бесканальная прокладка, L = 86 м

Том 2

Сдал:
Представитель подрядчика

_____ / И. И. Иванов /

Принял:
Представитель заказчика по
строительному контролю

_____ / П. П. Петров /

Реестр исполнительной документации

Участок тепловой сети УТ-3 – УТ-5. Том 2

№	Наименование документа	№ док.	Дата	Листов
1	Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы	1	02.09.2026	2
2	Акт разбивки осей трассы на местности	2	02.09.2026	2
3	АОСР: разработка траншеи	1	05.09.2026	3
4	АОСР: устройство песчаного основания	2	07.09.2026	3
5	АОСР: укладка трубопроводов в ППУ-изоляции	3	10.09.2026	3
6	АОСР: сварка стыков С-1 – С-12	4	11.09.2026	3
7	АОСР: изоляция стыковых соединений	5	15.09.2026	3
8	АОСР: устройство подсыпки и обратная засыпка	6	18.09.2026	3
9	Акт гидравлического испытания на прочность и герметичность	7	16.09.2026	2
10	Акт промывки трубопроводов	8	17.09.2026	1
11	Журнал сварочных работ	–	–	4
12	Заключение по визуальному и измерительному контролю стыков	ВИК-12	12.09.2026	2
13	Заключение по ультразвуковому контролю стыков	УЗК-12	13.09.2026	3
14	Исполнительная схема трассы УТ-3 – УТ-5	ИС-1	18.09.2026	1
15	Реестр сертификатов и паспортов	–	–	2
	Итого			37

Формы актов освидетельствования – по приказу Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр. Состав комплекта определяется проектной и рабочей документацией объекта.

Объект капитального строительства: Реконструкция тепловой сети 2Ду200 от УТ-3 до УТ-5 по ул. Условной, г. Н-ск (объект условный, все данные изменены)

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией, почтовый или строительный адрес объекта)

Застройщик, технический заказчик: ООО «Заказчик» (условно), ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, г. Н-ск

(наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица; для ИП – ФИО, ОГРНИП, ИНН)

Лицо, осуществляющее строительство: ООО «Подрядчик» (условно), ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000, СРО «Условное», ОГРН 0000000000000

(наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица; сведения о саморегулируемой организации)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: ООО «Проектировщик» (условно), ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000

(наименование, ОГРН, ИНН, адрес юридического лица; сведения о саморегулируемой организации)

**АКТ
освидетельствования скрытых работ № 3**

г. Н-ск

«10» сентября 2026 г.

Представители:

застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля: инженер технадзора П. П. Петров, НРС С-24-000000, приказ № 00 от 01.08.2026

(должность, фамилия, инициалы, номер в национальном реестре специалистов, реквизиты распорядительного документа)

лица, осуществляющего строительство: начальник участка И. И. Иванов, приказ № 00 от 01.08.2026

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа)

лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля: инженер ПТО С. С. Сидоров, НРС С-24-000001, приказ № 00 от 01.08.2026

(должность, фамилия, инициалы, номер в национальном реестре специалистов, реквизиты распорядительного документа)

произвели осмотр работ, выполненных ООО «Подрядчик» (условно), и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: укладка трубопроводов 20219×6 в ППУ-изоляции на подготовленное песчаное основание на участке УТ-3 – УТ-5, ПК0+00 – ПК0+86, L = 86 м

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации: шифр 00-26-ТС, листы 3–6, ООО «Проектировщик» (условно)

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации)

3. При выполнении работ применены: труба 219×6-1-ППУ-ПЭ по ГОСТ 30732-2020, паспорт № 0000/26; отводы 90°, паспорт № 0001/26 (реестр – приложение 2)

(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты документов о качестве)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: исполнительная схема ИС-1; заключение ВИК-12

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

5. Даты: начала работ «08» сентября 2026 г. окончания работ «10» сентября 2026 г.

6. Работы выполнены в соответствии с СП 74.13330.2023 «Тепловые сети», проектной документацией шифр 00-26-ТС

(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ: сварка стыков, контроль сварных соединений, изоляция стыков


(наименование работ, строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения: нет. Акт составлен в 3 экземплярах. Приложения: 1. Исполнительная схема ИС-1.
2. Реестр сертификатов.

Представитель застройщика по вопросам строительного контроля	_____	П. П. Петров
Представитель лица, осуществляющего строительство	_____	И. И. Иванов
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля	_____	С. С. Сидоров

Исполнительная схема трассы тепловой сети УТ-3 – УТ-5

Составлена по результатам исполнительной геодезической съёмки от 18.09.2026 (данные условные)

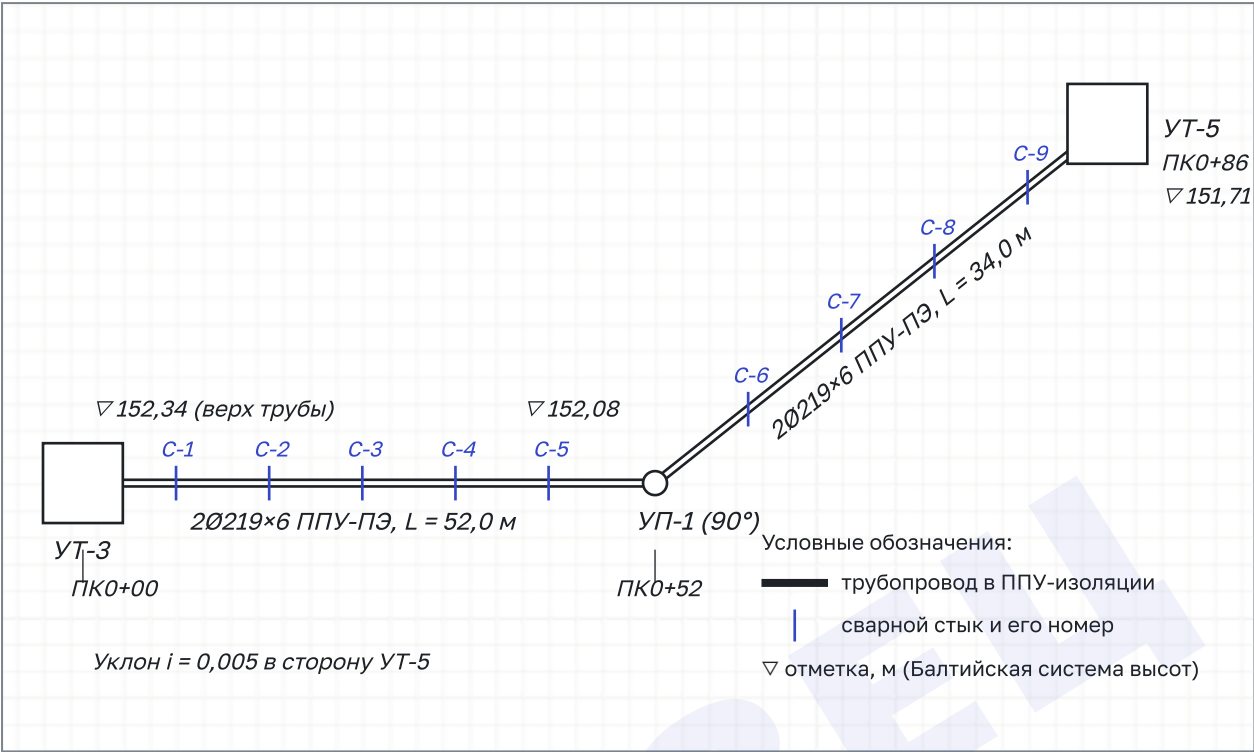

Отклонения от проекта в плане — не более 20 мм, по высоте — не более 15 мм. Номера стыков соответствуют журналу сварочных работ.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Исполнительная схема трассы тепловой сети УТ-3 – УТ-5	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Иванов			09.26		Р	1	1
Пров.		Петров			09.26		ООО «Подрядчик»		

АКТ № 7
о проведении гидравлического испытания трубопроводов
на прочность и герметичность

г. Н-ск

«16» сентября 2026 г.

Объект: Реконструкция тепловой сети 2Ду200 от УТ-3 до УТ-5 по ул. Условной, г. Н-ск (объект условный, все данные изменены)

Участок: тепловая сеть УТ-3 – УТ-5, подающий и обратный трубопроводы 20219×6, L = 86 м

Комиссия: представитель заказчика по строительному контролю П. П. Петров; представитель подрядчика И. И. Иванов; представитель эксплуатирующей организации К. К. Кузнецов

составила настоящий акт о том, что трубопроводы испытаны гидравлическим способом в соответствии с СП 74.13330.2023 «Тепловые сети» и проектом шифр 00-26-ТС.

Показатель	Подающий	Обратный
Рабочее давление, МПа	1,0	1,0
Пробное давление, МПа	1,25	1,25
Время выдержки под пробным давлением, мин	10	10
Падение давления за время выдержки	не зафиксировано	не зафиксировано
Осмотр при рабочем давлении	течей нет	течей нет
Манометр (класс точности, № поверки)	1,5; свидетельство № 0000/26 (условно)	

Заключение: трубопроводы испытание на прочность и герметичность выдержали.

Представитель заказчика по строительному контролю

_____ П. П. Петров

Представитель подрядчика

_____ И. И. Иванов

Представитель эксплуатирующей организации

_____ К. К. Кузнецов

Форма акта приведена для примера. Состав граф и значения давлений принимаются по проекту и требованиям эксплуатирующей организации.

Реестр сертификатов и паспортов

Приложение 2 к АОСР № 3 (данные условные)

№	Материал, изделие	Нормативный документ	Документ о качестве	Кол-во
1	Труба стальная в ППУ-изоляции 219×6-1-ППУ-ПЭ	ГОСТ 30732-2020	Паспорт № 0000/26	172 м
2	Отвод 90° 219×6 в ППУ-изоляции	ГОСТ 30732-2020	Паспорт № 0001/26	4 шт.
3	Комплект заделки стыка 219/315	ГОСТ 30732-2020	Сертификат № 0002/26	24 компл.
4	Электроды УОНИ-13/55 Ø3 мм	ГОСТ 9466-75	Сертификат № 0003/26	18 кг
5	Песок для строительных работ	ГОСТ 8736-2014	Документ о качестве № 0004/26	96 м³
6	Лента сигнальная «Осторожно! Теплотрасса»	ТУ условные	Паспорт № 0005/26	90 м

Копии документов о качестве прилагаются к реестру и являются его неотъемлемой частью.
